


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α.Μ.:5/2018
ΕΡΓΟΥ :1/2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1η Ενδεικτική Προθεσμία	2η Ενδεικτική προθεσμία	3η Ενδεικτική Προθεσμία	4η Ενδεικτική Προθεσμία	5η Ενδεικτική Προθεσμία
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΤΟΣ												ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ		
		ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΝΑΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ		ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ		ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ		ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ		ΜΑΡΤΙΟΣ				
			ΔΑΠΑΝΗ	%	ΔΑΠΑΝΗ	%	ΔΑΠΑΝΗ	%	ΔΑΠΑΝΗ	%	ΔΑΠΑΝΗ	%	ΔΑΠΑΝΗ			%	
1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	3.911,00	ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ..... ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ	586,65	15%	3.324,35	85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.911,00	2,20%	
2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	56.045,00		0,00	0%	40.464,49	72,20%	15.580,51	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	56.045,00	31,57%	
3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	18.950,00		0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	18950,00	100%	18.950,00	10,67%	
4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	87.790,50		0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%	19.928,44	22,70%	39055,00	44,49%	28807,06	33%	87.790,50	49,45%	
5 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	10.833,70		0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10833,70	100%	10.833,70	6,10%	
ΣΥΝΟΛΑ	177.530,20		586,65	0,33%	43.788,84	24,67%	15.580,51	8,78%	19.928,44	11,23%	39.055,00	22,00%	58.590,76	33,00%	177.530,20	100,00%	
		Σύνολο % =		0,33%		25,00%		45,00%		67,00%		100,00%					
						Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ						Α' ΤΡΙΜΗΝΟ					


Ο προϊστάμενος
Α.Χ




Μ.Ε.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Κατασκευή Μεταλλικών Κεραμιδιών
στο Γήπεδο Αχίου Γεωργίου

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΑ**

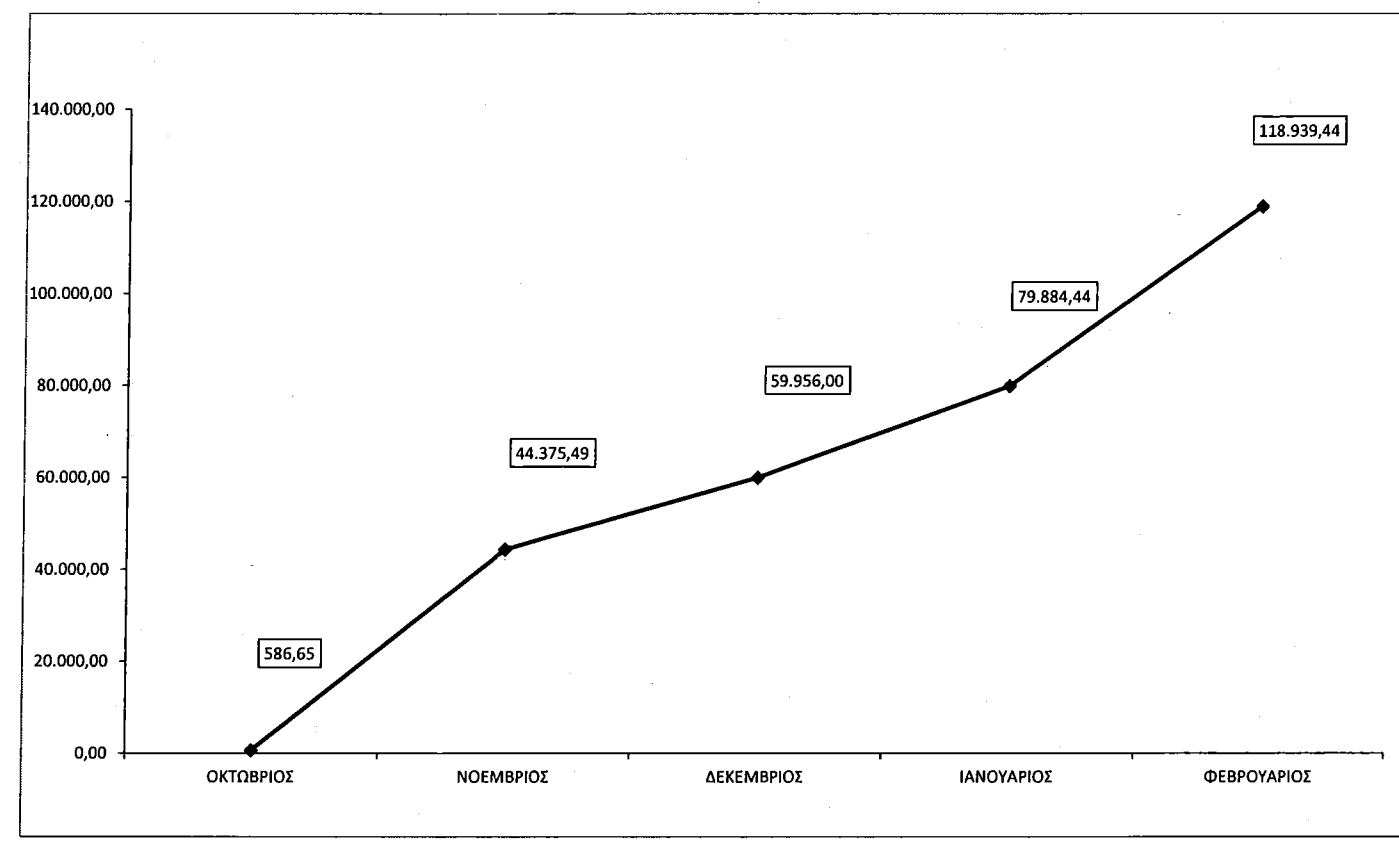

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ**

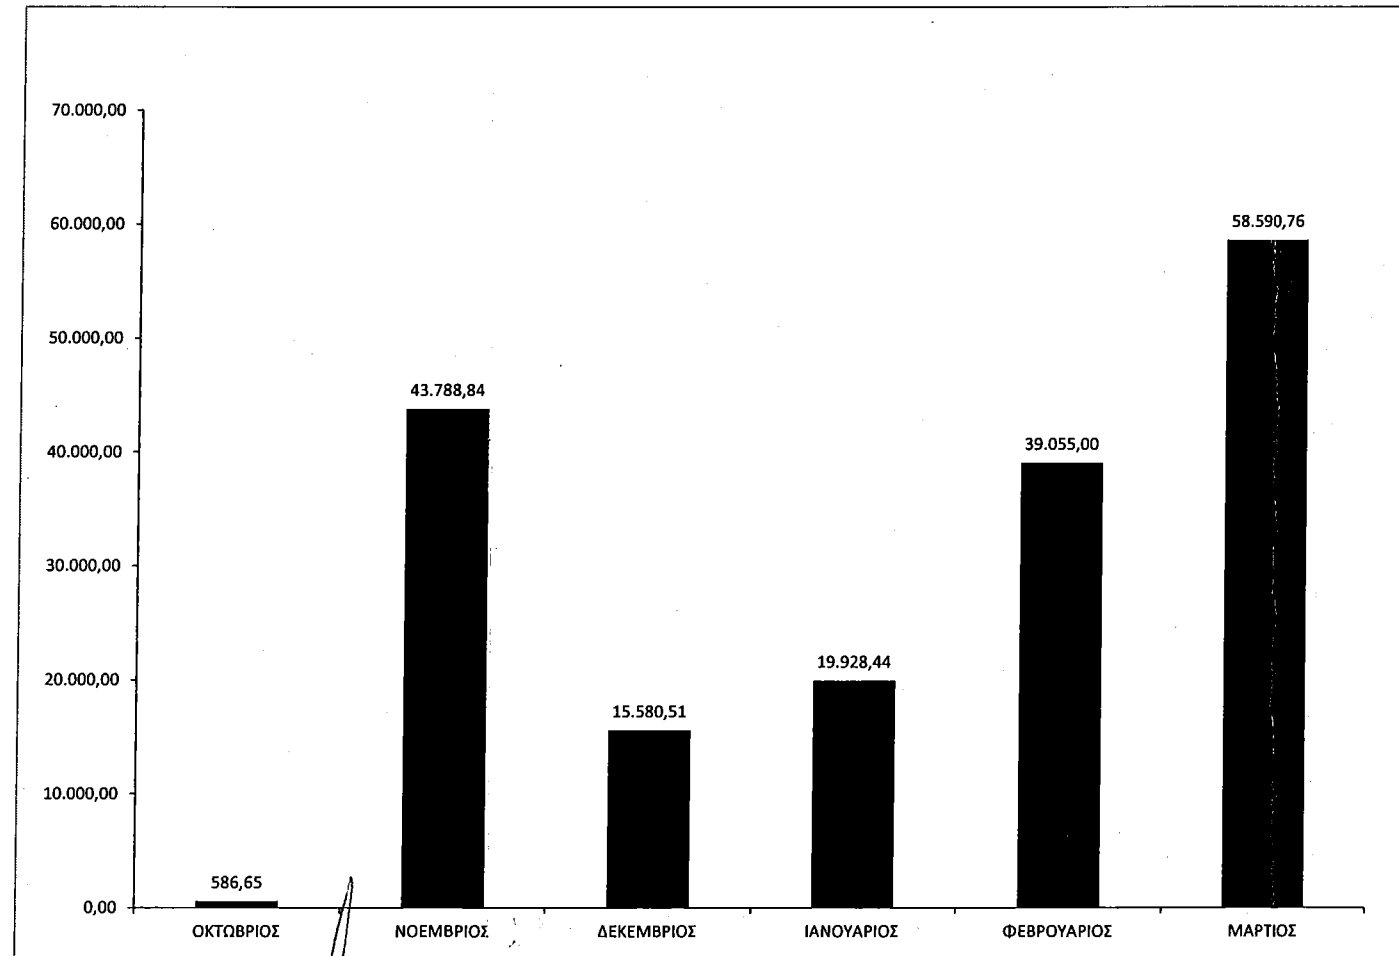

[Handwritten signature]

Βέροια
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

[Handwritten signature]

Μ.Ε.Δ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΟ. ΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
